Cronograma TG 1 — GLPI no SAV da Fatec Barueri

Oct 4, 2026 · @Gabriel

Visão geral

O TG 1 propõe o uso do GLPI, um sistema de gestão de chamados de código aberto, para organizar e priorizar os tickets do SAV (Secretaria Acadêmica Virtual) da Fatec Barueri. A mudança de rumo, do chatbot para o GLPI, foi recomendada pelo orientador em outubro; este cronograma substitui o anterior e segue o calendário oficial de entrega do TG do 2º semestre de 2026.

- **Período restante:** 26/10 a 11/12/2026. As Sprints 0 e 1 (05/10 a 25/10) já foram encerradas, incluindo a apresentação da 1ª versão ao orientador (19 a 23/10).
- **Datas oficiais que não podem atrasar:** entrega da versão para banca de **23 a 25/11**, bancas de **01 a 05/12** e versão final em PDF até **11/12**.
- **Feriados no período:** 02/11 e 20/11.
- **O que a banca vai ver:** monografia do TG 1, requisitos levantados com alunos e com a secretaria, e o GLPI configurado num ambiente de demonstração (categorias, FAQ, formulários, regras e prazos).

	TG 1 (este semestre)	TG 2 (próximo semestre)
Foco	Propor e configurar	Implantar e avaliar
Principal entrega	Monografia e GLPI configurado em ambiente de demonstração	GLPI em uso por alunos e resultados medidos
Avaliação	Validação da proposta com a secretaria	Indicadores do próprio GLPI: volume, prazos cumpridos, satisfação


Equipe e frentes

Cada integrante é responsável por configurar uma parte do GLPI e por escrever, na monografia, a seção sobre ela.

Integrante	Frente	O que produz no TG 1
David	Infraestrutura e acesso	Instalação do GLPI, entidade, grupos e perfis, notificações; seção sobre a arquitetura do ambiente
Gabriel	Lógica da triagem	Categorias, matriz de prioridade, SLAs e regras de negócio; seção sobre a triagem
Ian	Experiência do aluno	Catálogo de serviços, formulários e ajustes da interface; prints para a monografia e slides da banca
Indaiá	Conteúdo e documentação	Base de conhecimento (FAQ), requisitos, introdução

Integrante	Frente	O que produz no TG 1
		e revisão ABNT; contato com a secretaria

Cronograma resumido

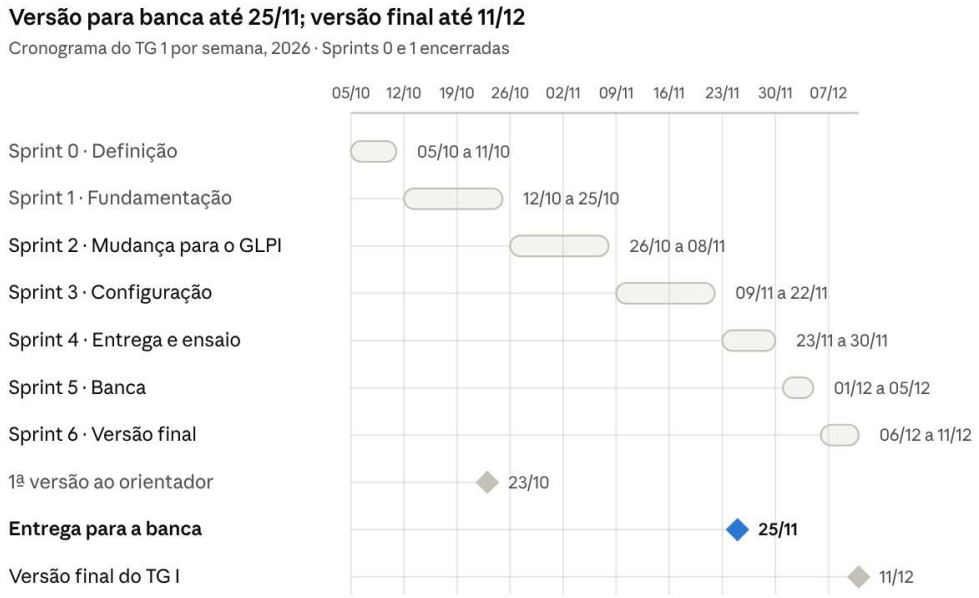

cronograma TG 1 · 7 sprints, 05/10 a 11/12/2026

A Sprint 3 termina com a monografia completa; a versão para banca é entregue entre 23 e 25/11, e a versão final em PDF até 11/12.

Tarefas por sprint

Sprints 0 e 1 — Encerradas (05/10 a 25/10)

Definição do tema, justificativa, questionários para alunos e funcionários, levantamento de trabalhos correlatos e apresentação da 1ª versão ao orientador (19 a 23/10), que recomendou trocar o chatbot pelo GLPI.

Sprint 2 — Mudança para o GLPI (26/10 a 08/11)

Meta: monografia reorientada para o GLPI e ambiente de demonstração instalado.

Integrante	Tarefas
David	Instalar o GLPI 11 (Docker ou servidor); criar a entidade, os grupos de atendimento e os perfis
Gabriel	Reescrever a fundamentação: ITIL, gestão de chamados, priorização por urgência × impacto e SLA; propor as categorias a partir dos tickets e

Integrante	Tarefas
	questionários
Ian	Levantar implantações de GLPI em instituições públicas e de ensino para os trabalhos correlatos; ocultar menus e campos de TI (Reservas, Dispositivos, Localização)
Indaiá	Consolidar os resultados dos questionários; atualizar introdução e justificativa para o GLPI; registrar os encontros de orientação

Entrega: fundamentação e correlatos atualizados; GLPI instalado e acessível à equipe.

Sprint 3 — Configuração e versão para banca (09/11 a 22/11)

Meta: GLPI configurado e monografia completa aprovada pelo orientador. Enviem a versão completa ao orientador até 18/11, para haver tempo de correção antes do prazo oficial.

Integrante	Tarefas
David	Notificações por e-mail; contas de demonstração (aluno, atendente, coordenação); seção sobre o ambiente
Gabriel	Categorias, matriz de prioridade, calendário de dias úteis, SLAs e regras de negócio; seção sobre a triagem
Ian	Catálogo de serviços e formulários por assunto, com condições; prints das telas para a monografia
Indaiá	Base de conhecimento com as dúvidas frequentes; metodologia, considerações finais, resumo, abstract e revisão ABNT

Entrega: monografia completa revisada e GLPI pronto para demonstração.

Sprint 4 — Entrega para banca e ensaio (23/11 a 30/11)

Meta: documentação entregue dentro do prazo oficial (23 a 25/11) e apresentação pronta.

Integrante	Tarefas
David	Garantir o ambiente estável para a demonstração; gravar um vídeo de reserva caso a conexão falhe
Gabriel	Preparar respostas às perguntas prováveis da banca (por que GLPI e não chatbot, LGPD, adoção real)
Ian	Finalizar os slides e o roteiro da demonstração ao vivo do GLPI
Indaiá	Entregar até 25/11: versão do TG para banca, ficha de concordância de submissão à banca e ficha de acompanhamento de orientação; acompanhar a programação das bancas (27/11)

Entrega: documentação da banca entregue; ensaio geral feito.

Sprint 5 — Banca (01/12 a 05/12)

Meta: apresentação feita e alterações pedidas pela banca registradas.

Integrante	Tarefas
David	Apresentar o ambiente e a arquitetura; conduzir a demonstração técnica
Gabriel	Apresentar a lógica da triagem: categorias, prioridade e prazos
Ian	Apresentar a experiência do aluno: catálogo, formulários e FAQ
Indaiá	Apresentar problema, objetivos e requisitos; anotar todas as alterações pedidas pela banca

Sprint 6 — Versão final (06/12 a 11/12)

Meta: versão final do TG I entregue até 11/12.

Integrante	Tarefas
David	Aplicar as correções nas seções técnicas
Gabriel	Aplicar as correções na seção da triagem e no plano do TG 2
Ian	Atualizar figuras e prints alterados
Indaiá	Montar a lista de alterações; revisão final; entregar a declaração de entrega da versão final e o PDF do TG I

Entrega: versão final do TG I em PDF e declaração de entrega.

Estrutura da monografia

Sugestão de sumário para o TG 1. Confiram com o modelo exigido pela coordenação.

Capítulo	Conteúdo	Responsável	Pronto em
1. Introdução	Contexto do SAV, problema, objetivos, justificativa	Indaiá	Sprint 2
2. Fundamentação teórica	Atendimento acadêmico, ITIL, central de atendimento, sistemas de chamados, priorização e SLA	Gabriel e Indaiá	Sprint 2
3. Trabalhos correlatos	Implantações de GLPI e soluções de triagem (incluindo os chatbots levantados)	Ian	Sprint 2
4. Metodologia	Abordagem da pesquisa, questionários, organização em sprints	Indaiá	Sprint 3

Capítulo	Conteúdo	Responsável	Pronto em
5. Levantamento de requisitos	Resultados dos questionários, análise dos tickets do SAV atual	Indaiá e Gabriel	Sprint 2
6. Proposta da solução	GLPI configurado: categorias, FAQ, formulários, regras, matriz de prioridade, SLAs e prints	Todos	Sprint 3
7. Planejamento do TG 2	Implantação com alunos e indicadores de avaliação	David e Gabriel	Sprint 3
8. Considerações finais	Síntese do TG 1 e próximos passos	Indaiá	Sprint 3

Rotina e pontos de atenção

Rotina

- **Orientação obrigatória:** pelo menos dois encontros com o orientador por mês, com registro. As reuniões de novembro vão de 03 a 19/11, e o registro entra na ficha de acompanhamento entregue até 25/11.
- **Início de cada sprint:** reunião de 1 h para dividir as tarefas e conferir pendências.
- **Durante a sprint:** atualização curta no grupo da equipe às segundas, quartas e sextas.

Uma seção está pronta quando

- está escrita na monografia, com citações no padrão ABNT;
- outro integrante leu e revisou;
- figuras, prints e tabelas têm título, número e fonte.

Pontos de atenção

- **Prazo apertado:** entre hoje e a entrega para banca há cerca de quatro semanas. A Sprint 3 não pode atrasar.
- **Justificar a mudança:** a banca pode perguntar por que o chatbot foi trocado pelo GLPI. Registrem na monografia que a troca foi recomendada pelo orientador e por quê: o problema central é a fila sem prioridade, e uma ferramenta de mercado resolve isso com menos risco.
- **O SAV real continua no osTicket:** o GLPI é uma proposta demonstrada em ambiente próprio; a adoção depende da secretaria e da TI do Centro Paula Souza.
- **LGPD:** atestados e dados de alunos nos chamados exigem perfis de acesso bem definidos. Usem só dados fictícios na demonstração.
- **Não prometer resultados:** o TG 1 apresenta a proposta e os indicadores; os números de desempenho vêm no TG 2.
